



ОНХС-ИЙН 2021 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

СУМЫН ИТХ-Н 2020 ОНЫ 3/03-Р ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ


Төсөл арга хэмжээний нэр Хүчин чадал, байршил	төсөвт өртөг /мян.төг/	тодотгосон төсөв /мян.төг/
1. Наадмын талбайн тохижилт	30,000	30,000
2. Ахуй үйлчилгээний шугам засвар	25,000	25,000
3. Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах	20,000	20,000
4. Дотуур байрны хатуу эдлэл солих	15,000	15,000
5. Сургуулийн ширээ сандал солих	22274,7	22274,7
Нийт дүн	112,274,7	112,274,7

Онхс-ийн 2021 оны төлөвлөгөө /гүйцэтгэл/

№	<u>Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал</u>	Төрөл (Бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)	<u>Төсөвт өртөг[3]</u> (мян.төг)	Тухайн онд санхүүжих дүн (мян.төг)	Гэрээ байгуулсан дүн	Гэрээ байгуулсан этгээдийн нэр
	1	2	3	4	5	6
	Орон нутгийн хөгжлийн сан					
1	Наадмын талбайн тохижилтын ажил	ажил	30,000	30,000	29,563,8	Баян их наяд консракшин
2	Хүүхдийн тоглоомын талбай	ажил	20,000	20,000	20,000	С.Өсөхбаяр
3	Хуучин ахуйн үйлчилгээний халуун усны бохир, халаалтыг засварлах	ажил	25,000	25,000	25,000	Өв дулаан ххк
4	Сумын спорт заалны урсгал засварын ажил	ажил	22,774,7	22,774,7		Өв дулаан ххк
5	Дотуур байрны хүүхдийн хатуу эдлэл шинэчлэх	Бараа	15,000	15,000	15,000	С.Өсөхбаяр
6	Сургуулийн ширээ сандал шинэчилэх	бараа	22,274,7	22,274,7	-	Энэ ажил хийгдээгүй
	Дүн		135,049,4	135,049,4	64,563,8	

1. Наадмын талбайн тохижилт

- “Онгон” 5-р багт наадмын талбайг баригдав
- Гүйцэтгэгч “Баян их наяд консракшин”
- Ажил эхэлсэн хугацаа 2021-06-07
- Ажил хүлээн авсан хугацаа 2021-07-26
- Нийт санхүүжилт 29,563,8 сая төгрөг

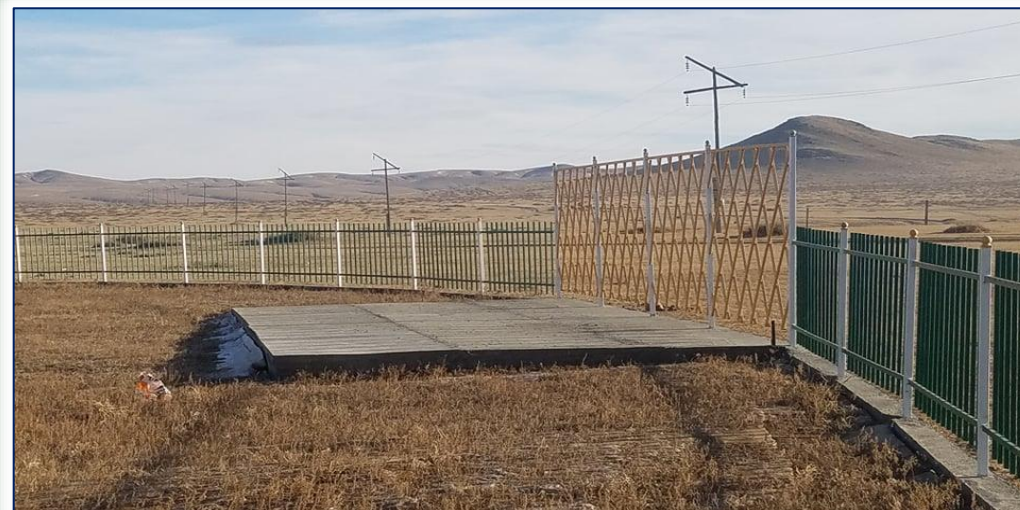

2. Ахуй үйлчилгээний шугам засвар

- “Онгон” 5-р багийн халуун ус
- Гүйцэтгэгч “Өв дулаан ххк”
- Ажил эхэлсэн хугацаа 2021-07-26
- Ажил хүлээн авсан хугацаа 2021-09-08
- Нийт санхүүжилт 25,000 сая төгрөг



3. Хүүхдийн тоглоомын талбай

- “Онгон” 5-р багт хүүхдийн тоглоомын талбай баригдав
 - Гүйцэтгэгч “С.Өсөхбаяр”
 - Ажил эхэлсэн хугацаа 2021-09-21
 - Ажил хүлээн авах хугацаа 2021-12-31
 - Нийт санхүүжилт 20,000 сая төгрөг
- Тайлбар: хил гааль хаалттай учир материал татан авалт хүлээгдэж байгаа



4. Дотуур байрны хатуу эдлэл солих

- “Онгон” 5-р баг ебс-ийн дотуур байр
- Гүйцэтгэгч “С.Өсөхбаяр”
- Ажил эхэлсэн хугацаа 2021-07-26
- Ажил хүлээн авсан хугацаа 2021-08-30
- Нийт санхүүжилт 15,000 сая төгрөг



5. Спорт заалны засвар

- “Онгон” 5-р баг сумын төв спорт заалны засвар
- Гүйцэтгэгч “Өв дулаан ххк ”
- Ажил эхэлсэн хугацаа 2021-07-24
- Ажил хүлээн авсан хугацаа 2021-09-22
- Нийт санхүүжилт 61,012 сая төгрөг үүнээс-сумаас 22,747,7 төгрөгөөр халаалтын шугамыг “Өв дулаан ххк гүйцэтгэсэн, Пүүлүү бумба ххк-38,264,3 төгрөгөөр дотор, дээврийн ажлыг тус тус засварласан.

